



# HOPITAL FONDATION ROTHSCHILD

Lettre info Riverains n°12 du 25/10/2024

spie batignolles

/ ile-de-france




# PLANNING CHANTIER

## Hôpital Fondation Rothschild



**46** MOIS DE TRAVAUX



**08H00 À 20H00**  
DU LUNDI AU VENDREDI

SUIVI DU CALENDRIER EXE Hopital ROTHSCHILD Paris 19

spie batignolles  
/ile-de-france

Phases Principales du Projet	2023				2024				2025				2026				2027
	1T 23	2 T 23	3 T 23	4T 23	1T 24	2T 24	3T 24	4T 24	1T 25	2T 25	3T 25	4T 25	1T 26	2T 26	3T 26	4T 26	1T 27
OS marché : 09/01/2023	◆																
Préparation et installation de chantier	■																
Travaux préliminaires Phase 0 et démolition des emprises pour la construction du Futur Bâtiment		■	■	■	■	■	■	■									
Réalisation du Futur Bâtiment									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Levée des réserves et Mise en service																	■

Page 1

Avancement au 25/10/2024



Repositionnement de l'écran d'informations sur la rue Manin pour une meilleure visibilité.

spie batignolles

/ile-de-france

# AVANCEMENT DES TRAVAUX

## Hôpital Fondation Rothschild



spie batignolles

/ile-de-france

### PHASE 0

- Installation Escalier extérieur Tour Incendie.
- Mise en service du Groupe Electrogène Provisoire.
- Mise en service des deux groupes froids en terrasse R+7.
- Mise en service de la Plateforme Fluides Médicaux Cour Manin.
- Mise en service la salle de neuroradiologie interventionnelle.
- Mise en service de la zone de logistique provisoire.
- Mise à disposition des travaux des accès Pompiers Tour incendie Cour Manin.
- Mise en service du Bâtiment Provisoire au 58 Avenue Mathurin Moreau.
- Démolition de l'auditorium et des passerelles cour Moreau.
- Mise à disposition de l'IRM 2 dans l'ancien Bâtiment Cour Moreau.
- Réalisation d'un prototype témoin locaux Futur Bâtiment.

# TRAVAUX DU TRIMESTRE A VENIR


## Hôpital Fondation Rothschild

Octobre à décembre 2024

Zone Mathurin Moreau –  
Réalisation des poteaux du Futur Bâtiment IRM  
Moreau et zone carneau extérieur.

### Cour intérieure Moreau

Réalisation des réseaux de la galerie technique.  
Fin de la déconstruction de l'auditorium, des  
passerelles Ancien Bâtiment – Nouveau Bâtiment et  
Galerie R+2.  
Début fondations et infrastructures Futur Bâtiment.

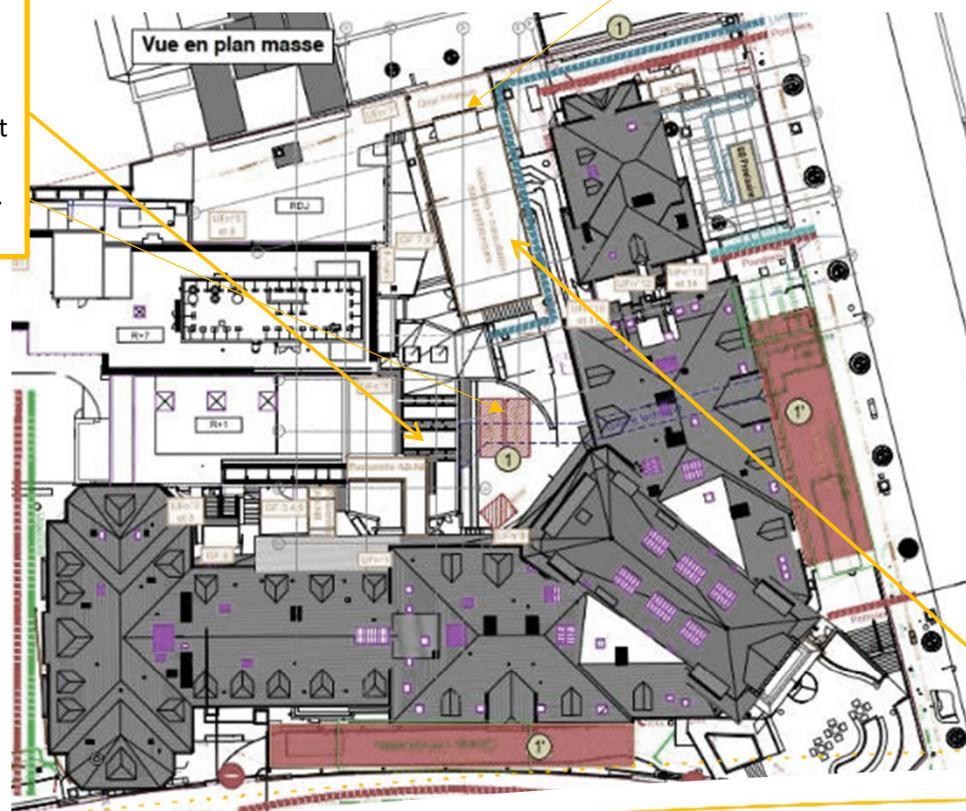

Zone Mathurin Moreau –  
Déconstruction Bâtiment  
Modulaire et curage Pavillon  
Moreau.

# AVANCEMENT DES TRAVAUX – Mise en service du Bâtiment Provisoire

## Hôpital Fondation Rothschild



# Démolition Bâtiment « Bungalow » Hôpital Fondation Rothschild



# Travaux Fondations Futur Bâtiment Zone IRM et NRI Moreau. Hôpital Fondation Rothschild



# Réalisation du Bâtiment Témoin (Bâtiment Provisoire). Hôpital Fondation Rothschild




# AVANCEMENT DES TRAVAUX – Déconstruction des passerelles et de l'auditorium.

## Hôpital Fondation Rothschild



# Nouvelle Emprise sur Avenue Mathurin Moreau en prévision des travaux de la Phase 1 Hôpital Fondation Rothschild

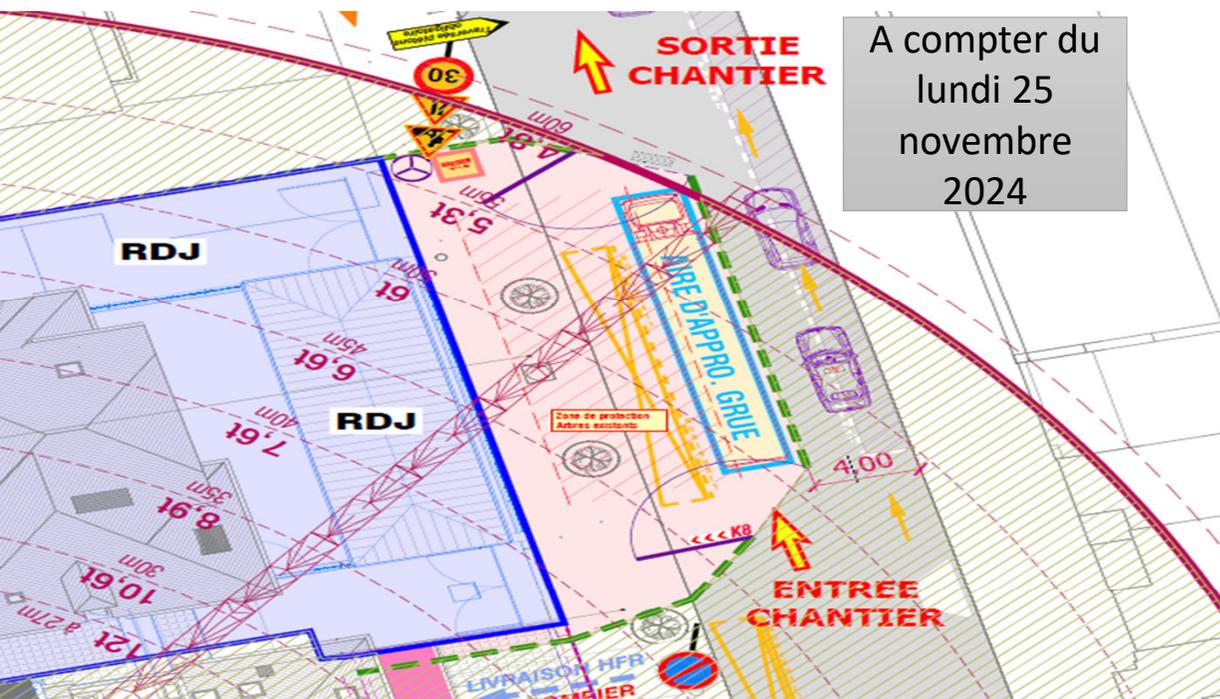

A compter du  
lundi 25  
novembre  
2024

