



HOPITAL FONDATION ROTHSCHILD

Lettre info Riverains n°11 du 23/09/2024

spie batignolles

/ ile-de-france



PLANNING CHANTIER

Hôpital Fondation Rothschild

SUIVI DU CALENDRIER EXE - Hôpital ROTHSCHILD Paris 19 -

spie batignolles

/ile-de-france




46 MOIS DE TRAVAUX



08H00 À 20H00
DU LUNDI AU VENDREDI

spie batignolles

/ile-de-france

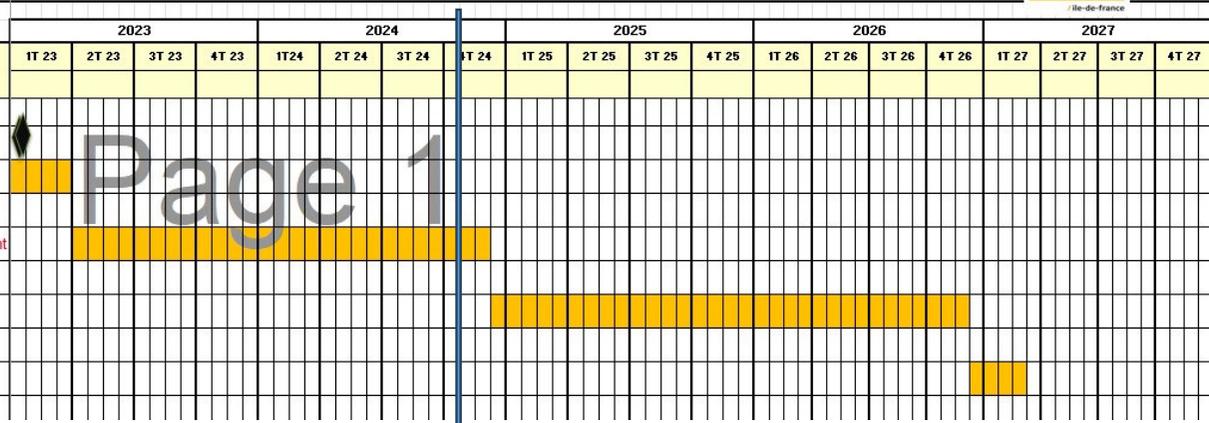

Page 1

Avancement au 23/09/2024



Repositionnement de l'écran d'informations sur la rue Manin pour une meilleure visibilité.

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Hôpital Fondation Rothschild



PHASE 0

- Installation Escalier extérieur Tour Incendie.
- Mise en service du Groupe Electrogène Provisoire.
- Mise en service début avril des deux groupes froids en terrasse R+7.
- Essais de mise en service de la Plateforme Fluides Médicaux Cour Manin.
- Mise en service la salle de neuroradiologie interventionnelle.
- Mise en service du Bâtiment Provisoire Avenue Mathurin Moreau.
- Démolition de l'auditorium et des passerelles.


TRAVAUX DU TRIMESTRE A VENIR

Hôpital Fondation Rothschild

Septembre à novembre 2024

Cour intérieure Moreau

Réalisation des réseaux de la galerie technique.
Fin de la déconstruction de l'auditorium, des passerelles Ancien Bâtiment – Nouveau Bâtiment et Galerie R+2.
Début fondations et infrastructures Futur Bâtiment.

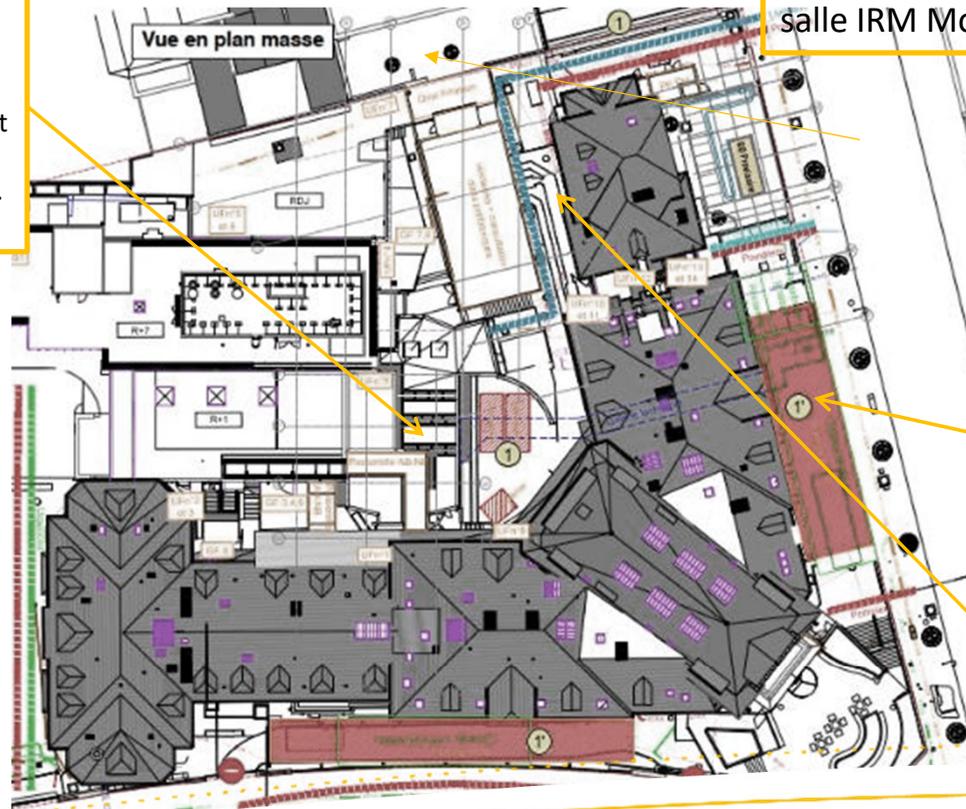

Zone Mathurin Moreau –
Déconstruction Ancienne Plateforme Fluides Médicaux Zone Moreau.
Réalisation des poteaux du Futur Bâtiment dans la salle IRM Moreau et la zone carneau extérieure.

Zone Mathurin Moreau –
Mise en service du Bâtiment Provisoire.

Zone Mathurin Moreau –
Déconstruction Bâtiment Modulaire et curage Pavillon Moreau.


AVANCEMENT DES TRAVAUX – Mise en service du Bâtiment Provisoire.

Hôpital Fondation Rothschild





AVANCEMENT DES TRAVAUX – Mise en service de la zone logistique provisoire Moreau

Hôpital Fondation Rothschild

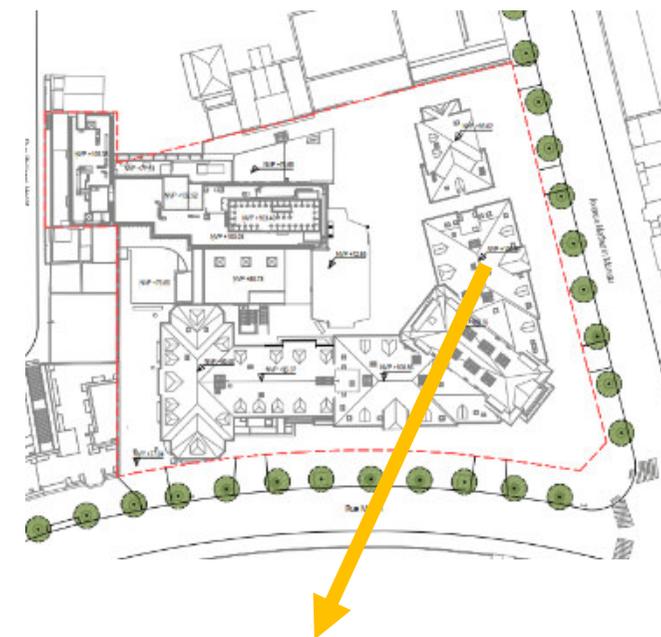

Zone logistique provisoire Moreau

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Mise en service Salle de Neuroradiologie interventionnelle. Hôpital Fondation Rothschild

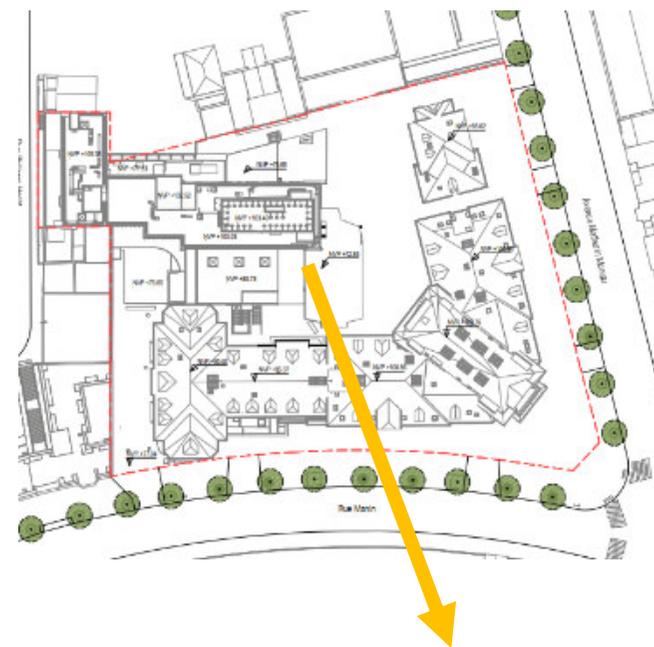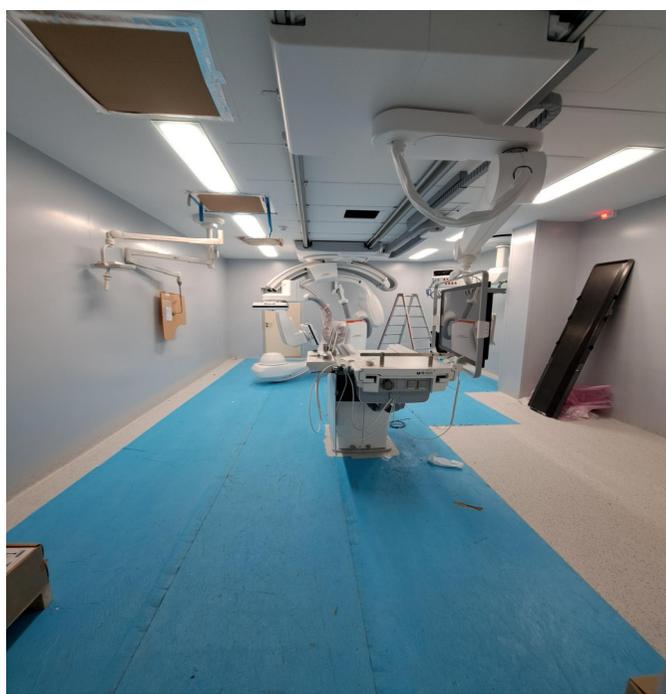

Mise en service de la
Salle de neuroradiologie interventionnelle.

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Déconstruction des passerelles et de l'auditorium Hôpital Fondation Rothschild

